IT工程伦理与项目管理

主讲人：尹勋钊
xzyin1@zju.edu.cn

2026年6月12日星期五

第14次课
目录
Contents

18 项目采购管理
- 18.1 采购管理概述
- 18.2 规划采购管理
- 18.3 实施采购
- 18.4 控制采购

19 项目相关方管理


附：**PMBOK**第七版简介

18.1采购管理概述

- ❖采购管理的目的
  - 降低固定成本和经常性成本
  - 把工作重点放在核心业务上
- ❖采购管理的过程
  - 规划采购管理：记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方
  - 实施采购: 获取卖方应答、选择卖方并授予合同
  - 控制采购: 管理采购关系、监督合同绩效、实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程

18.1采购管理概述

❖项目采购管理子过程

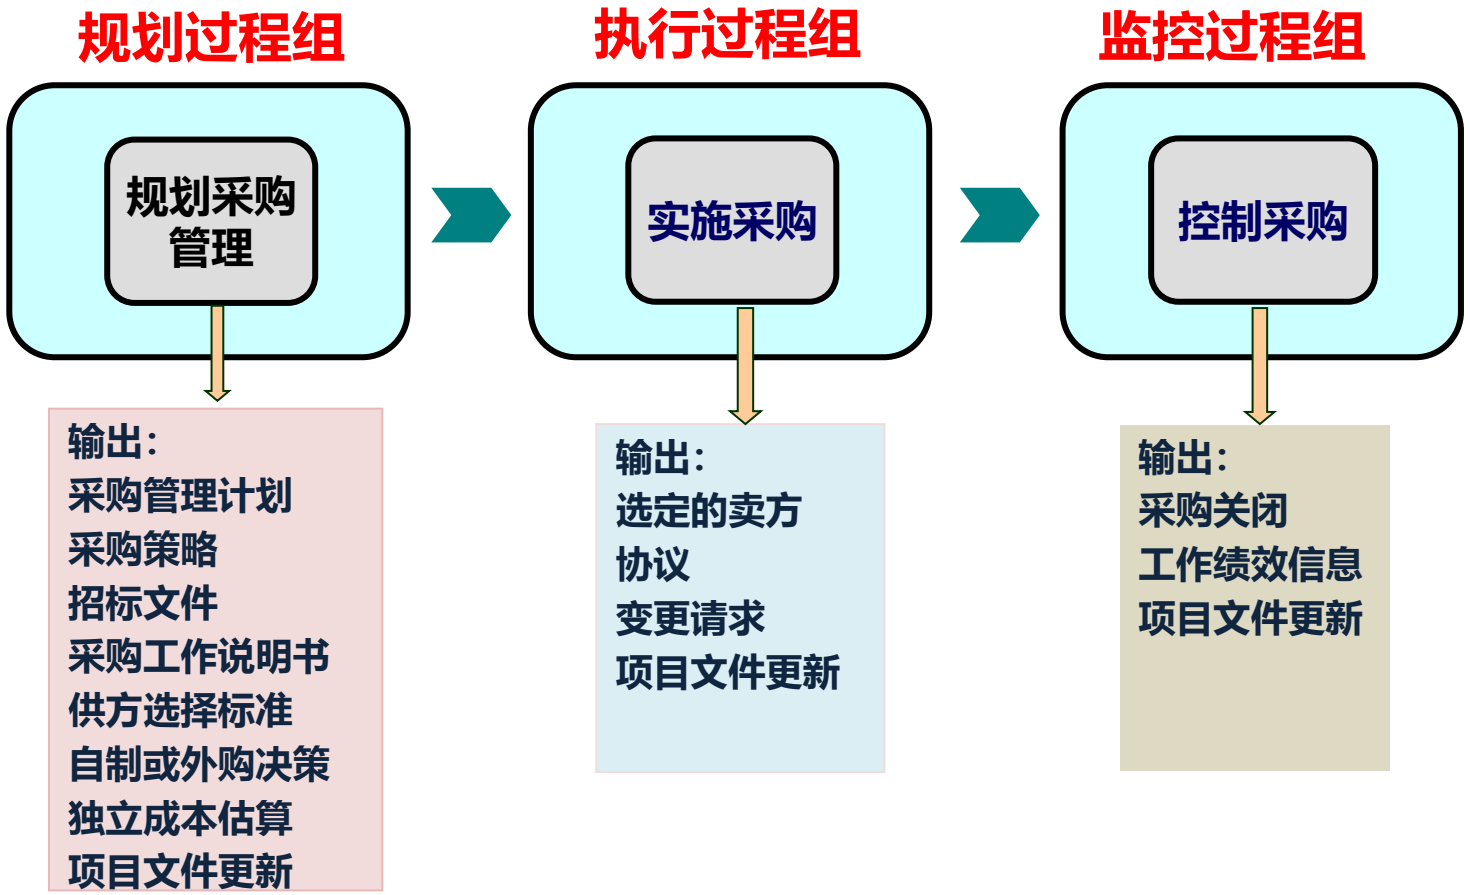

18.2 规划采购管理

❖ **规划采购管理是记录项目采购决策、明确采购方法，及识别潜在卖方的过程**

- **主要作用是，确定是否从项目外部获取货物和服务，如果是，则还要确定将在什么时间、以什么方式获取什么货物和服务。**
- **本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展**

输入	工具和技术	输出
.1项目章程 .2商业文件 ·商业论证 ·效益管理计划 .3项目管理计划 ·范围、质量、资源管理计划 ·范围基准 .4项目文件 ·里程碑清单 ·项目团队派工单 ·需求文件、需求跟踪矩阵 ·资源需求、风险登记册 ·相关方登记册 .5事业环境因素 .6组织过程资产	.1专家判断 .2数据收集 ·市场调研 .3数据分析 ·自制或外购分析 .4供方选择分析 .5会议	.1采购管理计划 .2采购策略 .3招标文件 .4采购工作说明书 .5供方选择标准 .6自制或外购决策 .7独立成本估算 .8变更请求 .9项目文件更新 ·经验教训登记册 ·里程碑清单 ·需求文件、需求跟踪矩阵 ·风险登记册、相关方登记册 .10组织过程资产更新

18.2 规划采购管理

❖典型的步骤可能有：

- 准备采购工作说明书 (SOW) 或工作大纲 (TOR)；
- 准备高层级的成本估算，制定预算；
- 发布招标广告；
- 确定合格卖方的短名单；
- 准备并发布招标文件；
- 由卖方准备并提交建议书；
- 对建议书开展技术（包括质量）评估；
- 对建议书开展成本评估；
- 准备最终的综合评估报告（包括质量及成本），选出中标建议书；
- 结束谈判，买方和卖方签署合同。

18.2 规划采购管理

❖ 规划采购管理的输入

- **项目章程**，包括目标、项目描述、总体里程碑，以及预先批准的财务资源
- **商业文件**：
  - **商业论证**，需要和商业论证保持一致，以确保商业论证的有效性
  - **效益管理计划**，收益管理计划描述应在何时产出具体的项目收益
- **项目管理计划**
  - **范围管理计划、质量管理计划、资源管理计划**
  - **范围基准**，包含范围说明书、WBS 和 WBS 词典
- **项目文件**
  - **里程碑清单**，说明卖方需要在何时交付成果
  - **项目团队派工单、需求文件、需求跟踪矩阵**
  - **资源需求、风险登记册、相关方登记册**
- **事业环境因素**，如市场条件、可从市场获得的产品、服务和成果等
- **组织过程资产**：卖方清单、正式的采购政策、程序和指南、**合同类型**等

18.2 规划采购管理

❖ 规划采购管理的工具与技术

- **专家判断**
- **数据收集：市场调研**，包括考察行业情况和具体卖方的能力
- **数据分析:自制或外购分析**用于确定某项工作或可交付成果最好由项目团队自行完成，还是应该从外部采购
- **供方选择分析**
  - **最低成本法，**适用于标准化或常规采购;
  - **仅凭资质**，适用于采购价值相对较小，不值得花时间和成本开展完整选择过程的情况
  - **基于质量或技术方案得分。**邀请一些公司提交建议书，同时列明技术和成本详情；如果技术建议书可以接受，再邀请它们进行合同谈判
  - **独有来源（单一来源），**买方要求特定卖方准备技术和财务建议书，然后针对建议书开展谈判
  - **固定预算法，**要求在建议邀请书中向受邀的卖方披露可用预算，然后在此预算内选择技术建议书得分最高的卖方
- **会议，**可用于确定管理和监督采购的策略

合作协议

- 两个或多个实体为形成伙伴关系，合资关系或商定关系定义的合同协议
- 确定各方的买方-卖方角色
- 对于工作范围，竞争需求，分工边界，保密等各种问题也被提前约定

甲方：_____

乙方：_____

合作项目：_____

技术外包合作协议

- 合作内容
- 甲方的权利和义务
- 乙方的权利和义务
- 合作时间
- 费用支付方式
- 保密协议
- 违约方式
- 适用法律
- 争议解决和仲裁

自制或外购决策

- ❖ 从项目成本和预算制约维度考虑
- ❖ 从客户的进度和项目时限性要求
- ❖ 从对于后续项目的过程资产和经验积累角度

某企业每年需用A零件10万件，该零件即可以自制，又可以外购。若外购每件单价为40元；若自制，企业拥有多余的生产能力且无法转移，其单位成本为： 直接材料30元；直接人工6元 ；变动制造费用3元 。

- ◆ 自制总成本为：100 000×39=3 900 000（元）
- ◆ 外购总成本为：100 000×40=4 000 000（元）
- ◆ 企业应选择自制方案，可节约成本100 000元

假定自制A零件的生产能力可以转移，每年预计可以获得贡献毛利1 000 000元

		方案	
		自制A零件	外购A零件
项目	变动成本 机会成本	100 000×39=3 900 000 1 000 000	100 000×40=4 000 000
	相关成本合计	4 900 000	4 000 000

自制或外购详细影响因素


- ◆ 经济利益
- ◆ 质量保证
- ◆ 供应的可靠性
- ◆ 专利
- ◆ 技能与材料
- ◆ 灵活性
- ◆ 生产的专业化程度
- ◆ 其他因素

合同类型总结

名称		缩写	特点	对买方风险	适合场景
固定总价	固定总价格	FFP	一口价，不容易改变范围	最小	产品范围很明确时
	总价加激励费用	FPIF	允许有一定的绩效偏离，完成给奖励	约定比例分担风险	成本和酬金都是浮动的
	总价加经济价格调整	FP-EPA	周期长，避免受外界不可控情况的影响		履约合同周期长
成本补偿合同	成本加成本	CPPC	花的多，给的多，买方参与多	最大	范围不明确，买方较强项目管理能力
	成本加固定奖励	CPFF	奖金不变	-	范围不明确时
	成本加奖励	CPIF	奖励节约，反对浪费	-	范围不明确，有明确的惩罚奖励条件
时间材料合同（单价合同）		T&M	单位时间 固定价格，谈判快	-	范围不明确，缺乏项目管理能力

合同类型风险情况

- 固定总价合同对卖方而言风险最高，成本加价合同对买方风险最高
- 时间材料合同相当来说风险居中，双方都比较容易接受

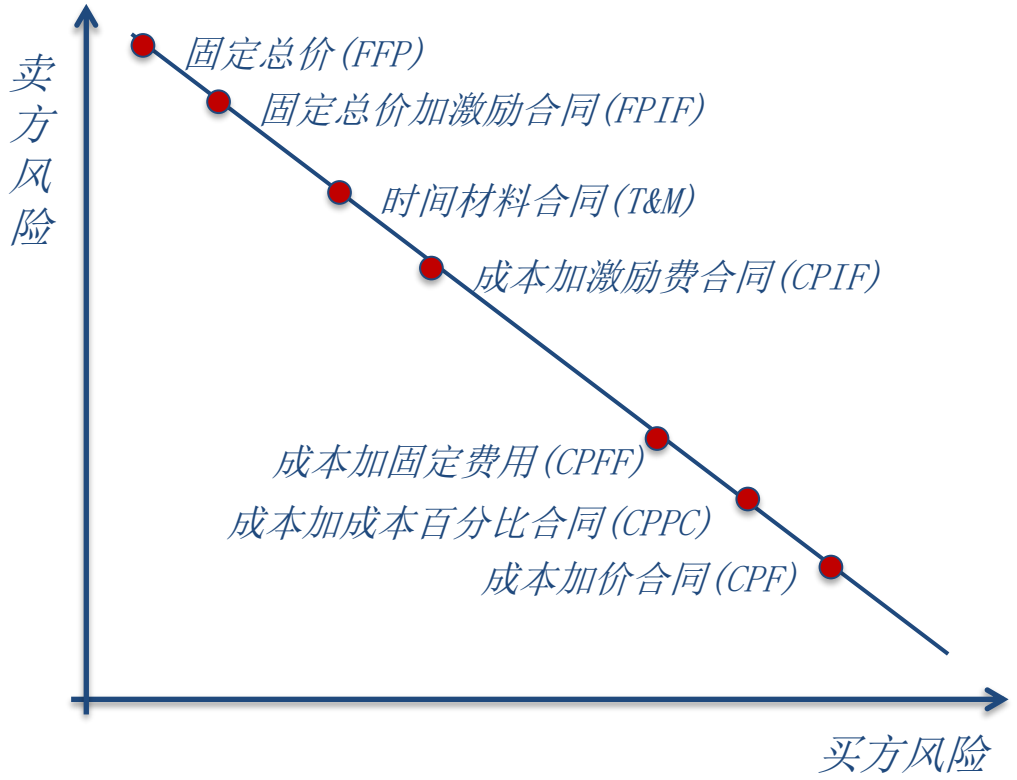

18.2 规划采购管理

❖ 规划采购管理的输出

- **采购管理计划**,包含要在采购过程中开展的各种活动
- **采购策略**
  - **交付方法、合同支付类型、采购阶段**
- **招标文件**
  - **信息邀请书 (RFI)、报价邀请书 (RFQ)、建议邀请书 (RFP)**
- **采购工作说明书** 内容包括:规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求
- **供方选择标准** 能力和潜能；产品成本和生命周期成本；交付日期；技术专长和方法；具体的相关经验；……
- **自制或外购决策** 做出某特定工作最好自己完成，还是需要从外部采购的决策
- **独立成本估算** 自行准备独立估算，或聘用外部专业估算师做出成本估算
- **变更请求**
- **项目文件更新：经验教训登记册、里程碑清单、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册**
- **组织过程资产更新**
  - **合格卖方的信息**

19.2 规划采购管理

❖ **采购管理计划**可包括以下内容：

- 如何协调采购与项目的其他工作，例如，项目进度计划制定和控制；
- 开展重要采购活动的时间表；
- 用于管理合同的采购测量指标；
- 与采购有关的相关方角色和职责；如果执行组织有采购部，项目团队拥有的职权和受到的限制；
- 可能影响采购工作的制约因素和假设条件；
- 司法管辖权和付款货币；
- 是否需要编制独立估算，以及是否应将其作为评价标准；
- 风险管理事项，包括对履约保函或保险合同的要求，以减轻某些项目风险；
- 拟使用的预审合格的卖方（如果有）。
- 根据每个项目的需要，采购管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

18.2 规划采购管理

采购工作说明书

- 详细描述产品服务或成果，是**卖方的范围**确定输入
- 包括规格，数量，质量，性能参数，履约期限，工作地点和其它内容
- 清晰简练，但是仍需说明需要附带服务，如绩效报告或项目运营支持等

工作范围说明书

- 项目背景和概述
- 项目目标
- 项目范围
- 项目工作内容
- 项目输出和交付
- 项目进度要求
- 双方责任
- 验收标准和考核要求

供方选择标准-举例

河北移动某无线产品框架采购项目招标公告

- 中华人民共和国境内注册，独立法人资格，不接受联合体投标
- 注册资金在5000万以上
- 企业具有ISO9000，ISO14000认证体系证书
- 最近三年类似产品每年销售额在1000万人民币以上
- 最近三年没有骗取中标或严重违约等问题
- 具有国家工程施工资质证明，安全生产许可证明

18.2 规划采购管理

采购方案

- ***公开招标:*** 招标人以招标公告的方式邀请特别特定的法人或其他组织投标
- ***邀请招标:*** 招标人以邀请投标书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
- ***竞争性谈判:*** 采购人邀请特定的对象谈判，并允许谈判对象二次报价确定签约人的采购方式
- ***单一来源:*** 采购人与供应商直接谈判确定合同的实质性内容的采购方式
- ***询价:*** 采购人邀请特定的对象一次性询价确定签约人的采购方式

18.3 实施采购

❖ **实施采购是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程**

- **主要作用是，选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议。**
- **本过程应根据需要在整个项目期间定期开展**

输入	工具和技术	输出
.1项目管理计划 .范围、需求、沟通、风险、采购管理计划 ·配置管理计划 .成本基准 .2项目文件 ·经验教训登记册 ·项目进度计划 ·需求文件 ·风险登记册 ·相关方登记册 .3采购文档 .4卖方建议书 .5事业环境因素 .6组织过程资产	.1专家判断 .2广告 .3投标人会议 .4数据分析 ·建议书评价 .5人际关系与团队技能 .谈判	.1选定的卖方 .2协议 .3变更请求 .4项目管理计划更新 ·需求、质量、沟通、风险、采购管理计划 ·范围、进度、成本基准 .5项目文件更新 ·经验教训登记册 ·需求文件 ·需求跟踪矩阵 ·资源日历 ·风险登记册 ·相关方登记册 .6组织过程资产更新

18.3 实施采购

❖ 实施采购的输入

- **项目管理计划**
  - **范围管理计划、需求管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划**
  - **配置管理计划，定义了哪些是配置项，哪些配置项需要正式变更控制，以及针对这些配置项的变更控制过程**
  - **成本基准，成本基准包括用于开展采购的预算，用于管理采购过程的成本，以及用于管理卖方的成本**
- **项目文件**
  - **经验教训登记册**
  - **项目进度计划**
  - **需求文件**
  - **风险登记册**
  - **相关方登记册**
- **采购文档:**
  - **招标文件、采购工作说明书、独立成本估算、供方选择标准**
- **卖方建议书 （投标书）**
- **事业环境因素，**如关于采购的当地法律和法规、卖方的当地法律和法规、市场条件、合作的相关经验、之前使用的协议等
- **组织过程资产，**如预审合格的优先卖方清单、会影响卖方选择的组织政策、模板或指南、财务政策和流程等

18.3 实施采购

❖实施采购的工具与技术

- **专家判断**
- **广告**，是就产品、服务或成果与用户或潜在用户进行的沟通
- **投标人会议**（又称承包商会议、供应商会议或投标前会议）
- **数据分析**
  - **建议书（标书）评价**，评估确定它们是否响应了招标文件包要求
- **人际关系与团队技能**
  - **谈判，为达成协议而进行的讨论**

建议书评价技术

NO	综合评价指标	权重	评分	合计
1	对于采购方需求的理解程度	10	70	700
2	产品质量是否符合项目标准	20	85	1700
3	产品价格是否具有相对优势	15	65	975
4	供应商设备规模和供货能力	5	50	250
5	生产用原材料的来源和质量	2	50	100
6	供应商的全面质量管理水平	15	70	1050
7	供应商的组织管理能力评估	3	80	240
8	其资金能力和财务信用状况	5	55	275
9	产地与项目实施地点的距离	2	40	80
10	产品供应交通运输的方便性	3	80	240
11	售后服务的水平及反应速度	10	50	500
12	厂家的市场销售历史和信誉	10	60	600
总分		100	62.9	6710

18.3 实施采购

❖实施采购的输出

- **选定的卖方**：被判断为最有竞争力的投标人
- **协议**：合同是对双方都有约束力的协议
- **变更请求**
- **项目管理计划更新**
  - **需求管理计划、质量管理计划、沟通管理计划、**
  - **风险管理计划、采购管理计划**
  - **范围基准、进度基准、成本基准**
- **项目文件更新**
  - **经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵、资源日历、风险登记册、 相关方登记册**
- **组织过程资产更新,** 潜在和预审合格的卖方清单、与卖方合作的相关经验，包括正反两方面

18.3 实施采购

- 协议文本的主要内容会有所不同，可包括：
  - 采购工作说明书或主要的可交付成果；
  - 进度计划、里程碑，或进度计划中规定的日期；
  - 绩效报告；
  - 定价和支付条款；
  - 检查、质量和验收标准；
  - 担保和后续产品支持；
  - 激励和惩罚；
  - 保险和履约保函；
  - 下属分包商批准；
  - 一般条款和条件；
  - 变更请求处理；
  - 终止条款和替代争议解决方法。

❖练习题

– 下列哪项最好地描述了项目经理在采购过程中的任务?

- A.项目经理只有次要的责任
- B.项目经理必须是谈判代表
- C.项目经理必须提供对项目风险的理解
- D.项目经理必须帮助对合同进行法律审查

18.4 控制采购

❖ **控制采购是管理采购关系，监督合同绩效，实施必要的变更和纠偏，以及关闭合同的过程**

- **确保买卖双方履行法律协议，满足项目需求**
- **本过程应根据需要在整个项目期间定期开展**

输入	工具和技术	输出
.1项目管理计划 ·需求、风险、采购、变更管理计划，·进度基准 .2项目文件 ·假设日志 ·经验教训登记册 ·里程碑清单、质量报告 ·需求文件、需求跟踪矩阵 ·风险登记册 ·相关方登记册 .3协议 .4采购文档 .5批准的变更请求 .6工作绩效数据 .7事业环境因素 .8组织过程资产	.1专家判断 .2索赔管理 .3数据分析 ·绩效审查 ·挣值分析 ·趋势分析 .4检查 .5审计	.1采购关闭 .2工作绩效信息 .3采购文档更新 .4变更请求 .5项目管理计划更新 ·风险、采购管理计划 ·进度、成本基准 .6项目文件更新 ·经验教训登记册 ·资源需求 ·需求跟踪矩阵 ·风险登记册 ·相关方登记册 .7组织过程资产更新

18.4 控制采购

❖ 控制采购的输入

- **项目管理计划**
  - **需求管理计划、风险管理计划、采购管理计划、变更管理计划，进度基准**
- **项目文件**
  - **假设日志、经验教训登记册、里程碑清单、质量报告**
  - **需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册**
- **协议**，对照相关协议，确认其中的条款和条件的遵守情况。
- **采购文档**，包括工作说明书、支付信息、承包商工作绩效信息、计划、图纸等
- **批准的变更请求**，可能包括对合同条款和条件的修改
- **工作绩效数据**
- **事业环境因素**，合同变更控制系统、市场条件、财务管理和应付账款系统等；
- **组织过程资产**，如采购政策

18.4 控制采购

❖控制采购的工具与技术

- **专家判断**
- **索赔管理**
  - 如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更
- **数据分析：绩效审查、挣值分析 (EVA)、趋势分析**
- **检查**，是指对承包商正在执行的工作进行结构化审查
- **审计**，是对采购过程的结构化审查。

18.4 控制采购

❖ 控制采购的输出

- **采购关闭**，向卖方发出合同已经完成的正式书面通知
- **工作绩效信息**，是卖方正在履行的工作的绩效情况
- **采购文档更新,包括用于支持合同的全部进度计划、已提出但未批准的合同变更等**
- **变更请求**
- **项目管理计划更新**
  - **风险管理计划、采购管理计划、进度基准、成本基准**
- **项目文件更新**
  - **经验教训登记册**，记录能有效维护采购工作的范围、进度和成本的技术
  - **资源需求**, 因工作执行不符合原定计划而需要变更资源需求
  - **需求跟踪矩阵**
  - **风险登记册**，每个被选中的卖方都会带来特殊的风险
  - **相关方登记册**, 承包商和供应商可能发生变更,则需要更新
- **组织过程资产更新**：支付计划和请求、卖方绩效评估文件、预审合格卖方清单更新、经验教训知识库、采购档案

– **投标人会议属于：**
  - **A.规划采购**
  - **B.管理采购**
  - **C.实施采购**
  - **D.沟通管理**

第14次课

目录

Contents

18 项目采购管理
19 项目相关方管理
19.1 相关方管理概述
19.2 识别相关方
19.3 规划相关方参与
19.4 管理相关方参与
19.5 监督相关方参与
PMBOK第七版简介

19.1 相关方管理概述

相关方(干系人)是指能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织，以及会受或自认为会受项目决策、活动或结果影响的个人、群体或组织。相关方可能主动参与项目，或他们的利益会因项目实施或完成而受到积极或消极的影响。

每个项目都有相关方，他们会受项目的积极或消极影响，或者能对项目施加积极或消极的影响

项目相关方管理的目的是识别能够影响项目或会受项目影响的人员、团体或组织，分析相关方对项目的期望和影响，制定合适的管理策略来有效调动相关方参与项目决策和执行。

项目相关方是在项目生命周期中，对项目的目标或执行过程造成直接或间接的影响的个人或组织。


不同层面的影响

- **在现在或将来进行影响**
- **对项目目标或执行过程造成影响**
- **消极或积极的影响**

还包括受项目影响的个人或组织



相关方与项目的关系

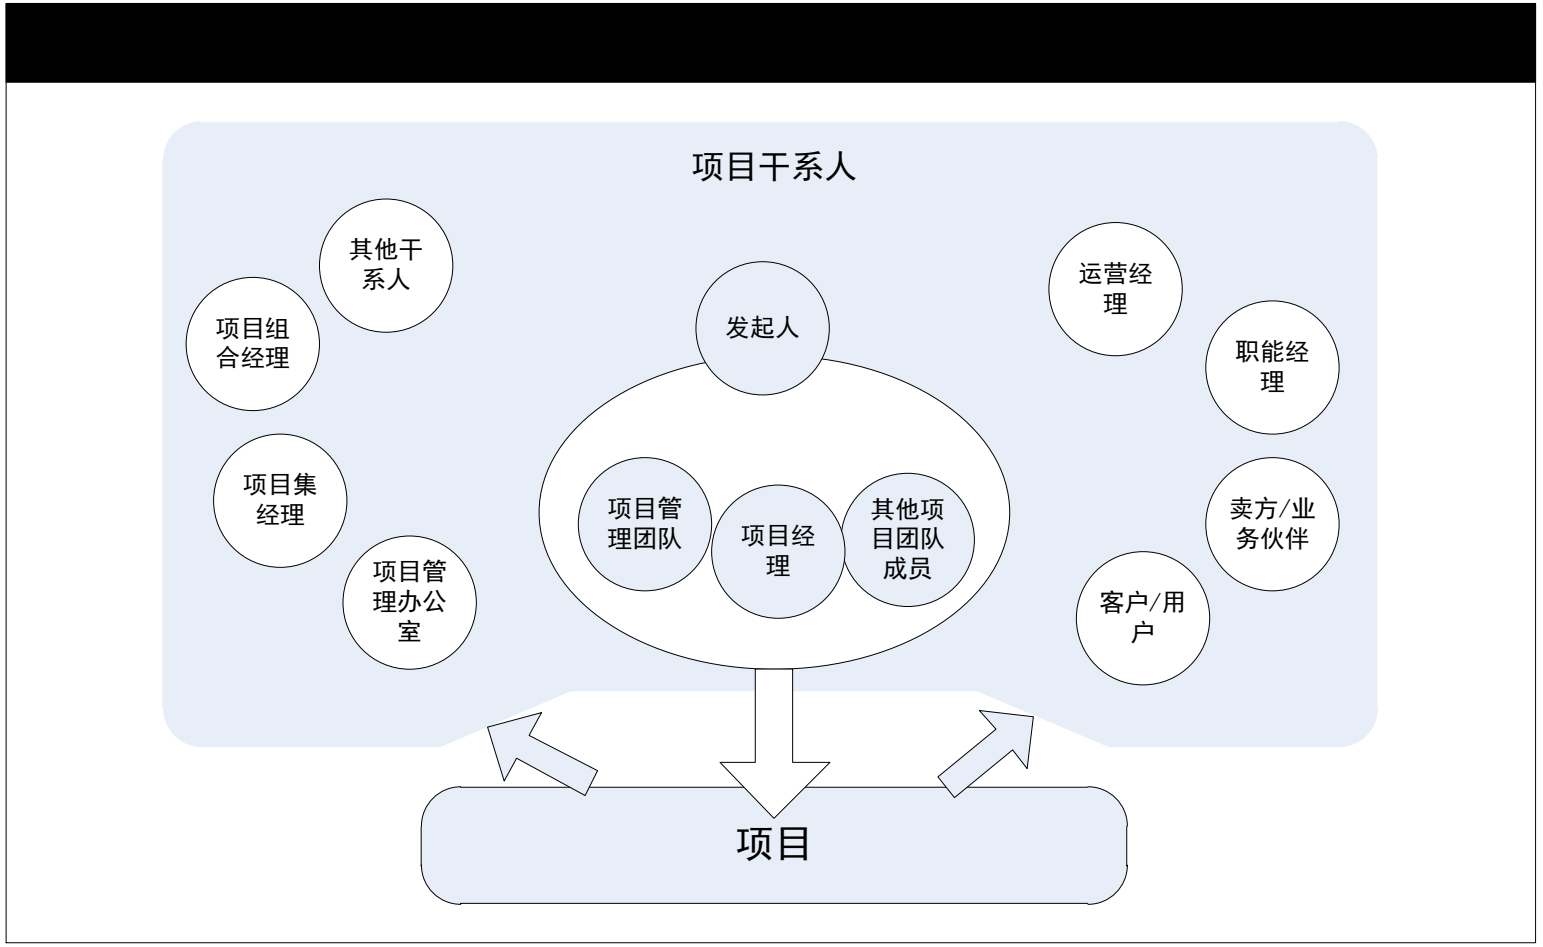
项目干系人
其他干系人
项目组合经理
项目集经理
项目管理办公室
发起人
项目管理团队
项目经理
其他项目团队成员
运营经理
职能经理
卖方/业务伙伴
客户/用户
项目


19.1 相关方管理概述

项目相关方管理的4个过程

- **识别相关方** — 识别相关方是定期识别项目相关方，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。
- **规划相关方参与** — 规划相关方参与是根据相关方的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目相关方参与项目的方法的过程。
- **管理相关方参与** — 管理相关方参与是与相关方进行沟通和协作，以满足其需求与期望，处理问题，并促进相关方合理参与的过程。
- **监督相关方参与** — 监督项目相关方关系，并通过修订参与策略和计划来引导相关方合理参与项目的过程。

19.1 相关方管理概述

❖项目相关方管理子过程

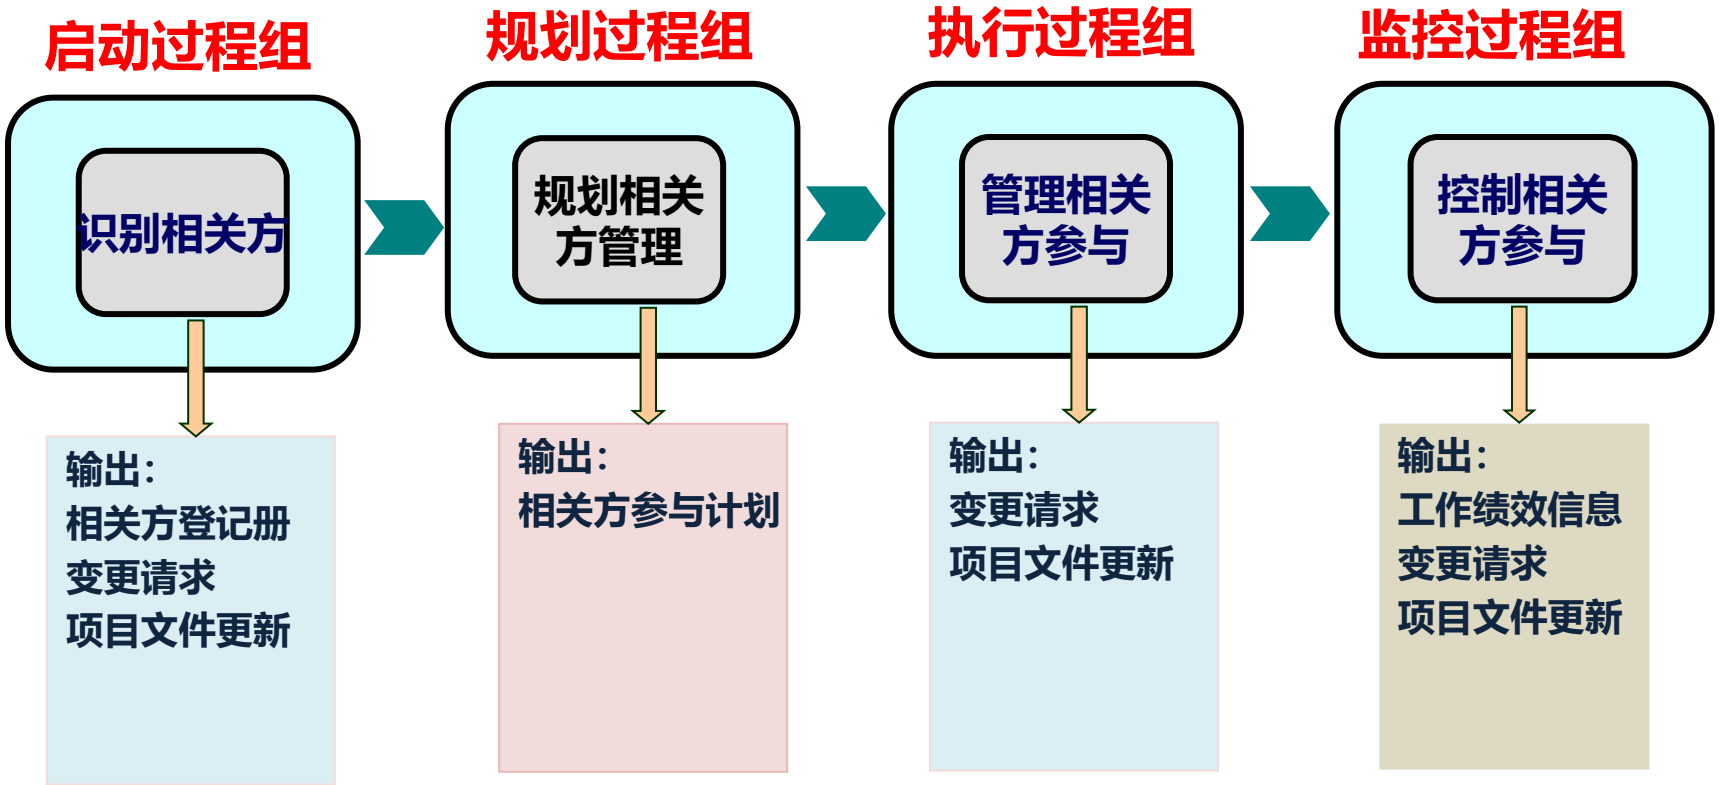

19.2 识别相关方

❖ **识别相关方是定期识别项目相关方，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响的过程。**

- **主要作用是，使项目团队能够建立对每个相关方或相关方群体的适度关注。**
- **本过程应根据需要在整个项目期间定期开展**

输入	工具和技术	输出
.1项目章程 .2商业文件 ·商业论证 ·效益管理计划 .3项目管理计划 ·沟通管理计划 ·相关方参与计划 .4项目文件 ·变更日志 ·问题日志 ·需求文件 .5协议 .6事业环境因素 .7组织过程资产	.1专家判断 .2数据收集 ·问卷调查 ·头脑风暴 .3数据分析 ·相关方分析 ·文件分析 .4数据表现 ·相关方映射分析/表现 .5会议	.1相关方登记册 .2变更请求 .3项目管理计划更新 ·需求管理计划 ·沟通管理计划 ·风险管理计划 ·相关方参与计划 .4项目文件更新 ·假设日志 ·问题日志 ·风险登记册

19.2 识别相关方

❖ 识别相关方的输入

- **项目章程**,会列出关键相关方清单，还可能包含与相关方职责有关的信息
- **商业文件**
  - **商业论证:** 商业论证确定项目目标，以及受项目影响的相关方的最初清单
  - **效益管理计划:** 描述了如何实现商业论证中所述收益, 受益人为相关方
- **项目管理计划**
  - **沟通管理计划**,沟通与相关方参与之间存在密切联系
  - **相关方参与计划**，确定了用于有效引导相关方参与的管理策略和措施
- **项目文件**
  - **变更日志**,可能引入新的相关方，或改变相关方与项目的现有关系的性质
  - **问题日志**,所记录的问题可能为项目带来新的相关方，或改变现有相关方的参与类型
  - **需求文件**，可以提供关于潜在相关方的信息
- **协议**，协议的各方都是项目相关方，还可涉及其他相关方
- **事业环境因素**：组织文化、政府或行业标准、设施和资源的地理分布等
- **组织过程资产**：相关方登记册模板和说明、以往项目的相关方登记册等


19.2 识别相关方

❖ 识别相关方的工具与技术

- **专家判断**
- **数据收集**
  - **问卷调查:** 可以包括一对一调查、焦点小组讨论，或其他大规模信息收集技术
  - **头脑风暴：** 包括头脑风暴、头脑写作(让参与者在小组创意讨论开始前单独思考)
- **数据分析**
  - **相关方分析：兴趣、权利、所有权、知识、贡献**
  - **文件分析，** 评估现有项目文件及以往项目的经验教训
- **数据表现**
  - **相关方映射分析/表现：权力利益网格、权力影响网格，或作用影响网格;**
  - **相关方立方体;**
  - **凸显模型;**
  - **影响方向(向上、向下、向外、横向);**
  - **优先级排序**
- **会议，** 可用于在重要项目相关方之间达成谅解

项目相关方网络图

- 项目经理
- 项目团队
- 支持团队
- 职能经理
- 高层经理
- 客户
- 项目出资人
- 管理团队
- 政府机构
- 实施组织
- 施加影响者

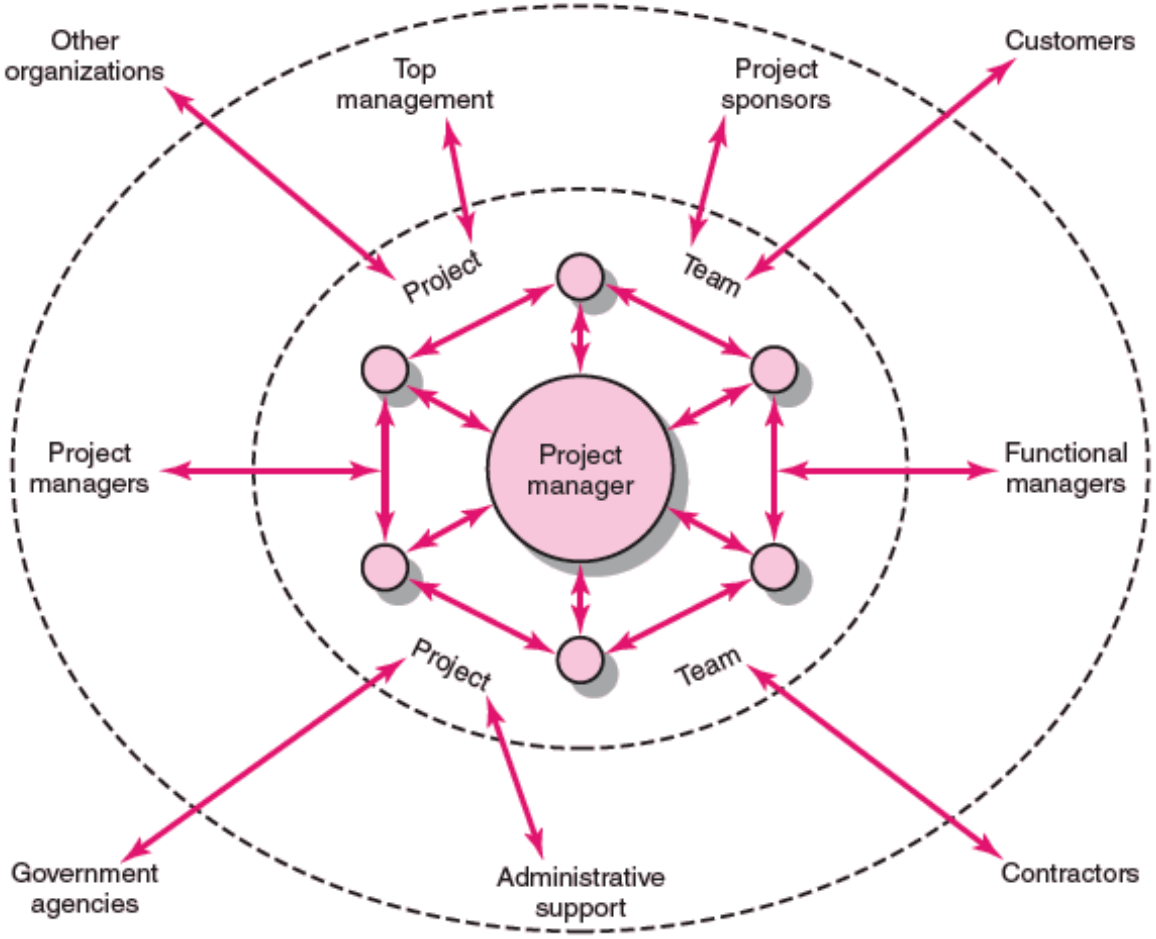


19.2 识别相关方

相关方分析

❖ 相关方是对你项目的目标达成有影响的所有人。

- 相关方的识别，相关方分析都不是相关方管理的最终目标
- 最终目的都将落到项目经理如何利用分析的结果，通过自身所拥有的资源、技能、沟通等去影响相关方的行为，以达成项目的目标。

- ❖ 权力：对项目能施加哪些影响？
- ❖ 利益：项目目标，项目收益情况
- ❖ 个人：个人在项目中期望如何？

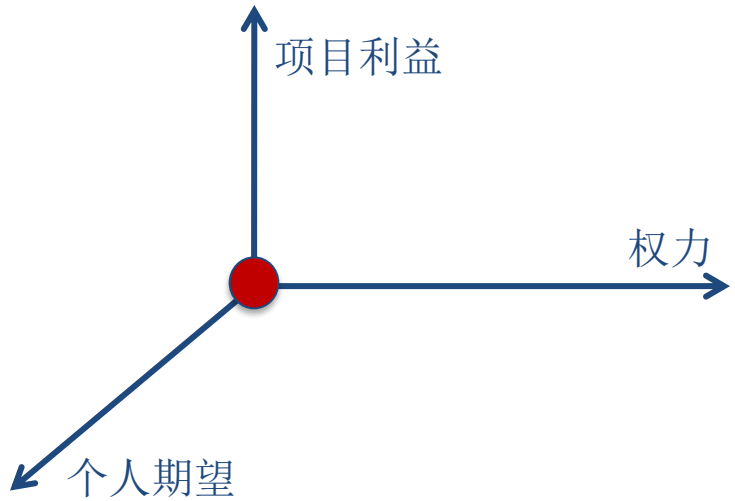

相关方分析-核心相关方

相关方	权力	利益	个人期望
客户高层领导	权力大，不直接参与项目 支持力度直接影响项目	项目目标，控制范围 获取资源支持	项目对领导层收益
客户	影响项目目标和验收	需求和项目范围控制	项目成败直接影响人
用户	最终使用者，影响验收 可能影响到领导决策	是否满足需求 项目范围的控制	项目交付成果好用
外部合作伙伴	沟通，谈判，竞争，妥协	项目成功满足合作利益	长期合作还是短期合作？
项目成员	沟通，谈判，竞争，妥协	核心资源 直接影响交互效率和质量	个人成长和锻炼 个人在项目中的收益
项目高层领导	不直接参与，影响项目决策和方向把控	资源投入	项目收益和团队

19.2 识别相关方

❖识别相关方过程的输出

- **相关方登记册**，记录关于已识别相关方的信息
- **变更请求**，新出现的相关方或现有相关方的新信息可能导致对产品、项目管理计划或项目文件提出变更请求
- **项目管理计划更新**
  - **需求管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、相关方参与计划**
- **项目文件更新**
  - **假设日志**，相关方参与度信息是基于一定假设条件的
  - **问题日志**，产生的新问题应该记录到问题日志中
  - **风险登记册**，记录在本过程中识别，并通过风险管理过程加以管理的新风险

19.2 识别相关方

❖相关方登记册

- 身份信息
  - 姓名、组织职位、地点、联系方式，以及在项目中扮演的角色
- 评估信息
  - 主要需求、期望、影响项目成果的潜力，以及相关方最能影响或冲击的项目生命周期阶段
- 相关方分类
  - 用内部或外部，作用、影响、权力或利益，上级、下级、外围或横向，或者项目经理选择的其他分类模型，进行分类的结果

19.2 识别相关方

相关方分析输出

- 相关方登记册(确保无遗漏)
- 相关方分析(对项目的影响，相关方之间影响，重要性排序)
- 相关方管理策略(施加影响，平衡利益)

人员	角色	权力	影响	支持度	重要性	期望
张三	出资方 客户	调整范围和资金投入	项目范围，进度和成本	高	高	最关注进度，资金灵活性大
李四						
王五						

19.3 规划相关方参与

❖ **规划相关方参与是根据相关方的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目相关方参与项目的方法的过程。**

- **主要作用是，提供与相关方进行有效互动的可行计划。**
- **本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。**

输入	工具和技术	输出
.1项目章程 .2项目管理计划 ·资源、沟通管理计划 ·风险管理计划 .3项目文件 ·假设日志 ·变更日志 ·问题日志 ·项目进度计划 ·风险登记册 ·相关方登记册 .4协议 .5事业环境因素 .6组织过程资产	.1专家判断 .2数据收集 ·标杆对照 .3数据分析 ·假设条件和制约因素分析 ·根本原因分析 .4决策 ·优先级排序/分级 .5数据表现 ·思维导图 ·相关方参与度评估矩阵 .6会议	.1相关方参与计划

19.3 规划相关方参与

❖规划相关方参与的输入

- **项目章程,**引导相关方参与项目时应该考虑项目目的、目标和成功标准
- **项目管理计划**
  - **资源管理计划，**关于团队成员及其他相关方的角色和职责的信息
  - **沟通管理计划，**用于相关方管理的沟通策略以及用于实施策略的计划
  - **风险管理计划，**风险临界值或风险态度，有助于选择最佳的相关方参与
- **项目文件**
  - **假设日志,**关于假设条件和制约因素的信息，可能与特定相关方相关联
  - **变更日志，**相关方是变更请求的提出者、审批者或受变更实施影响者
  - **问题日志,** 需要与受影响的相关方进行额外沟通
  - **项目进度计划,**把特定相关方指定为活动责任人或执行者
  - **风险登记册,**特定相关方指定为风险责任人或受风险影响者
  - **相关方登记册,**提供项目相关方的清单，以及分类情况和其他信息
- **协议,**与组织内的采购小组和（或）合同签署小组开展合作，根据协议对承包商和供应商进行有效管理
- **事业环境因素，**组织文化、政治氛围，以及治理框架，人事管理政策等
- **组织过程资产，**企业的社交媒体、道德和安全政策及程序，企业的问题、风险、变更和数据管理政策及程序，等

19.3 规划相关方参与

❖规划相关方参与的工具与技术

- **专家判断**
- **数据收集**
  - **标杆对照**,将相关方分析的结果与其他被视为世界一流的组织或项目的信息进行比较
- **数据分析**
  - **假设条件和制约因素分析**，以便合理剪裁相关方参与策略
  - **根本原因分析**，以便选择适当策略来改进其参与水平
- **决策**
  - **优先级排序/分级**，具有最大利益和最高影响的相关方，通常应该排在优先级清单的最前面
- **数据表现**
  - **思维导图**,用于对相关方信息、相互关系及他们与组织的关系进行可视化整理
  - **相关方参与度评估矩阵**,用于将相关方当前参与水平与期望参与水平比较
- **会议**，用于讨论与分析规划相关方参与过程所需的输入数据

19.3 规划相关方参与

❖ **相关方参与度评估矩阵。**相关方参与度评估矩阵用于将相关方当前参与水平与期望参与水平进行比较。

相关方	不知晓	抵制	中立	支持型	领导
相关方 1	C			D	
相关方 2			C	D	
相关方 3				D C	

C 代表每个相关方的当前参与水平，而 D 是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平（期望的）。

应根据每个相关方的当前与期望参与水平的差距，开展必要的沟通，有效引导相关方参与项目。弥合当前与期望参与水平的差距是监督相关方参与中的一项基本工作。

19.4 管理相关方参与

❖ 管理相关方参与是与相关方进行沟通和协作以满足其需求与期望、处理问题，并促进相关方合理参与的过程。

- 主要作用，让项目经理能够提高相关方的支持，尽可能降低相关方的抵制。
- 本过程需要在整个项目期间开展

输入	工具和技术	输出
.1项目管理计划 ·沟通管理计划 ·风险管理计划 ·相关方参与计划 ·变更管理计划 .2项目文件 ·变更日志 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·相关方登记册 .3事业环境因素 .4组织过程资产	.1专家判断 .2沟通技能 ·反馈 .3人际关系与团队技能 ·冲突管理 ·文化意识 ·谈判 ·观察/交谈 ·政治意识 .4基本规则 .5会议	.1变更请求 .2项目管理计划更新 ·沟通管理计划 ·相关方参与计划 .3项目文件更新 ·变更日志 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·相关方登记册

19.4 管理相关方参与

在管理相关方参与过程中，需要开展多项活动，例如：

- 在适当的项目阶段引导相关方参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺；
- 通过谈判和沟通管理相关方期望；
- 处理与相关方管理有关的任何风险或潜在关注点，预测相关方可能在未来引发的问题；
- 澄清和解决已识别的问题。

管理相关方参与有助于确保相关方明确了解项目目的、目标、收益和风险，以及他们的贡献将如何促进项目成功。

19.4 管理相关方参与

❖管理相关方参与 的输入

- **项目管理计划**
  - **沟通管理计划**，描述与相关方沟通的方法、形式和技术
  - **风险管理计划**，描述了风险类别、风险偏好和报告格式
  - **相关方参与计划**，为管理相关方期望提供指导和信息
  - **变更管理计划**，描述了提交、评估和执行项目变更的过程
- **项目文件**
  - **变更日志**，会记录变更请求及其状态，并将其传递给适当的相关方
  - **问题日志**，会记录项目或相关方关注点，及关于处理问题的行动方案
  - **经验教训登记册**，早期获取的与管理相关方参与有关的经验教训
  - **相关方登记册**，提供项目相关方清单,及执行相关方参与计划所需的任何信息
- **事业环境因素**,组织文化、政治氛围，以及组织的治理结构等
- **组织过程资产**，组织对沟通的要求等

19.4 管理相关方参与

❖管理相关方参与 的工具与技术

- **专家判断**
- **沟通技能**
  - **反馈:**正式与非正式对话；问题识别和讨论；会议；进展报告；调查。
- **人际关系与团队技能**
  - **冲突管理,**项目经理应确保及时解决冲突
  - **文化意识,**有助于项目经理和团队通过考虑文化差异和相关方需求
  - **谈判,**用于获得支持或达成支持工作或成果的协议，并解决各方冲突
  - **观察/交谈，**及时了解项目团队成员和其他相关方的工作和态度
  - **政治意识，**通过了解项目内外的权力关系，建立政治意识
- **基本规则，**根据团队章程中定义的基本规则，明确如何引导相关方参与
- **会议：**决策；问题解决；经验教训和回顾总结；项目开工；迭代规划；状态更新。

19.4 管理相关方参与

❖管理相关方参与 的输出

- **变更请求**，管理相关方参与的结果，项目范围或产品范围可能需要变更
- **项目管理计划更新**
  - **沟通管理计划**，以反映新的或已变更的相关方需求
  - **相关方参与计划**，以反映新的或更改的管理策略
- **项目文件更新**
  - **变更日志**
  - **问题日志**,以反映问题日志条目的更新或添加
  - **经验教训登记册**,记录管理相关方参与的有效或无效方法，以供当前或未来项目借鉴
  - **相关方登记册**,相关方的信息可有变化

19.5 监督相关方参与

❖ 监督相关方参与是监督项目相关方关系，并通过修订参与策略和计划来引导相关方合理参与项目的过程。

- 主要作用是，随着项目进展和环境变化，维持或提升相关方参与活动的效率和效果。
- 本过程需要在整个项目期间开展。

输入	工具和技术	输出
.1项目管理计划 ·资源管理计划 ·沟通管理计划 ·相关方参与计划 .2项目文件 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·项目沟通记录 ·风险登记册 ·相关方登记册 .3工作绩效数据 .4事业环境因素 .5组织过程资产	.1数据分析 ·备选方案分析 ·根本原因分析、相关方分析 .2决策 ·多标准决策分析、投票 .3数据表现 ·相关方参与度评估矩阵 4沟通技能 ·反馈、演示 .5人际关系与团队技能 ·积极倾听、文化意识 ·领导力、人际交往 ·政治意识、 .6会议	.1工作绩效信息 .2变更请求 .3项目管理计划更新 ·资源管理计划 ·沟通管理计划 ·相关方参与计划 .4项目文件更新 ·问题日志 ·经验教训登记册 ·风险登记册 ·相关方登记册

19.5 监督相关方参与

❖ 监督相关方参与 的输入

- **项目管理计划**
  - **资源管理计划**，资源管理计划确定了对团队成员的管理方法
  - **沟通管理计划**，描述了适用于项目相关方的沟通计划和策略
  - **相关方参与计划**，定义了管理相关方需求和期望的计划
- **项目文件**
  - **问题日志**，记录了所有与项目和相关方有关的已知问题
  - **经验教训登记册**，早期获取的经验教训，可用于项目后期阶段
  - **项目沟通记录**，与相关方开展的项目沟通，都已包括在项目沟通记录中
  - **风险登记册**，记录了与相关方参与及互动有关的风险
  - **相关方登记册**，记录了各种相关方信息：相关方名单、评估结果和分类情况
- **工作绩效数据**，包含项目状态数据，如，哪些相关方支持项目，他们的参与水平和类型
- **事业环境因素**,人事管理政策、相关方风险临界值、已确立的沟通渠道等
- **组织过程资产**，企业的社交媒体、道德和安全政策及程序，企业的问题、风险、变更和数据管理政策及程序，组织对沟通的要求等

19.5 监督相关方参与

❖监督相关方参与 的工具与技术

- **数据分析**
  - **备选方案分析**,在相关方参与效果没有达到期望要求时，应该开展备选方案分析，评估应对偏差的各种备选方案
  - **根本原因分析**,确定相关方参与未达预期效果的根本原因
  - **相关方分析**，确定相关方群体和个人在项目任何特定时间的状态
- **决策**
  - **多标准决策分析**，进行优先级排序和加权，识别出最适当的选项
  - **投票**，选出应对相关方参与水平偏差的最佳方案
- **数据表现**
  - **相关方参与度评估矩阵**，跟踪每个相关方参与水平的变化，对相关方参与加以监督

19.5 监督相关方参与

❖ 监督相关方参与 的工具与技术（续）

- **沟通技能**
  - **反馈**，用于确保发送给相关方的信息被接收和理解
  - **演示**，为相关方提供清晰的信息
- **人际关系与团队技能**
  - **积极倾听**，通过积极倾听，减少理解错误和沟通错误
  - **文化意识**，有助于依据相关方和团队成员的文化差异和文化需求对沟通进行规划
  - **领导力**，需要强有力的领导技能，以传递愿景并激励相关方支持项目工作和成果
  - **人际交往**，通过人际交往了解关于相关方参与水平的信息
  - **政治意识**，有助于理解组织战略，理解谁能行使权力和施加影响，以及培养与这些相关方沟通的能力
- **会议**
  - 会议的类型包括：为监督和评估相关方的参与水平而召开的状态会议、站会、回顾会，以及相关方参与计划中规定的其他任何会议

19.5 监督相关方参与

❖ 监督相关方参与 的输出

- **工作绩效信息**，包括与相关方参与状态有关的信息
- **变更请求**，包括用于改善相关方当前参与水平的纠正及预防措施
- **项目管理计划更新**
  - **资源管理计划**，可能需要更新团队对引导相关方参与的职责
  - **沟通管理计划**，可能需要更新项目的沟通策略
  - **相关方参与计划**，可能需要更新关于项目相关方社区的信息
- **项目文件更新**
  - **问题日志**，可能需要更新问题日志中与相关方态度有关的信息
  - **经验教训登记册**，遇到的挑战及其本可采取的规避方法，需要更新在经验教训登记册中
  - **风险登记册**，可能需要更新风险登记册，以记录相关方风险应对措施
  - **相关方登记册**，更新相关方登记册，以记录从监督相关方参与中得到的信息

职业道德

- 遵守所在公司的规定、遵守所在国的法律
- 除非说明是所在国家的习俗，否则不收取任何礼物
- 维护客户利益，保守商业机密
- 诚实，正直，客观，公正的汇报项目信息
- 职业化的素质就是尊重事实、为他人着想尊重文化差异，入乡随俗
- 避免利益冲突，如从事与公司竞争性的业务
- 尽量不采取极端的手段
- 维护范围完整是PMP的责任
- 以同等重要性和关注程度管理成本、进度计划和质量
- 在某客户的现场开展项目作业工作时，您意外的发现客户一些内部信息，您下一步应该： 将此信息通知客户 或者提醒客户注意信息风险
- 如果没有充分的数据完成一项任务，你应该 通过书面和口头做出解释， 说明在缺乏完整数据的情况下无法完成此任务-诚实
- 在与客户沟通时，项目经理应该尽力形成一种友好、诚恳、开放的关系
- 处理干系人利益冲突时，应该向有利于客户一方面的情况解决
- 维护自己所在公司的商业秘密，不能为以前同事提供任何信息


第14次课
目录

Contents

18 项目采购管理
19 项目相关方管理
附：PMBOK第七版简介

PMBOK第七版简介


- 在PMBOK第七版中，已经看不到传统的五大过程组和十大知识领域，取而代之的是八大绩效域和12个项目管理原则

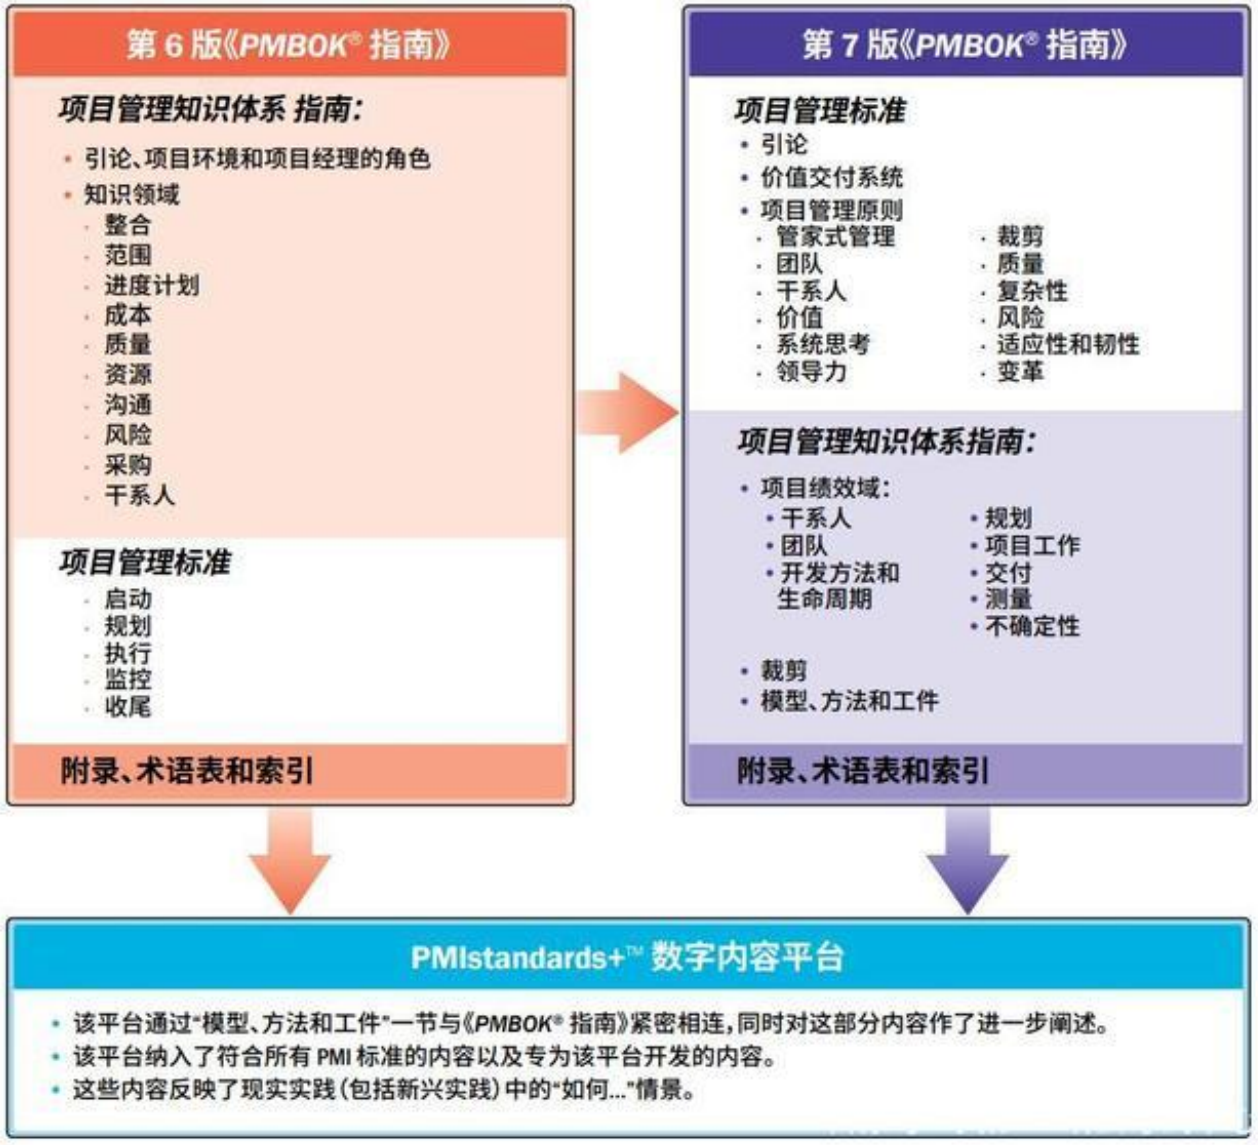

PMBOK第七版简介

- 原则是战略、决策和问题解决的基本指导准则
  - 项目管理的原则旨在指导项目参与者的行为
- 项目管理界最重要的四项价值观的基础：
  - 责任；
  - 尊重；
  - 公平；
  - 诚实。

项目管理原则			
成为勤勉、尊重和关心他人的管家	营造协作的团队环境	有效地干系人参与	聚焦于价值
识别、评估和响应系统交互	展现领导力行为	根据环境进行裁剪	将质量融入到过程和可交付物中
驾驭复杂性	优化风险应对	拥抱适应性和韧性	为实现预期的未来状态而驱动变革

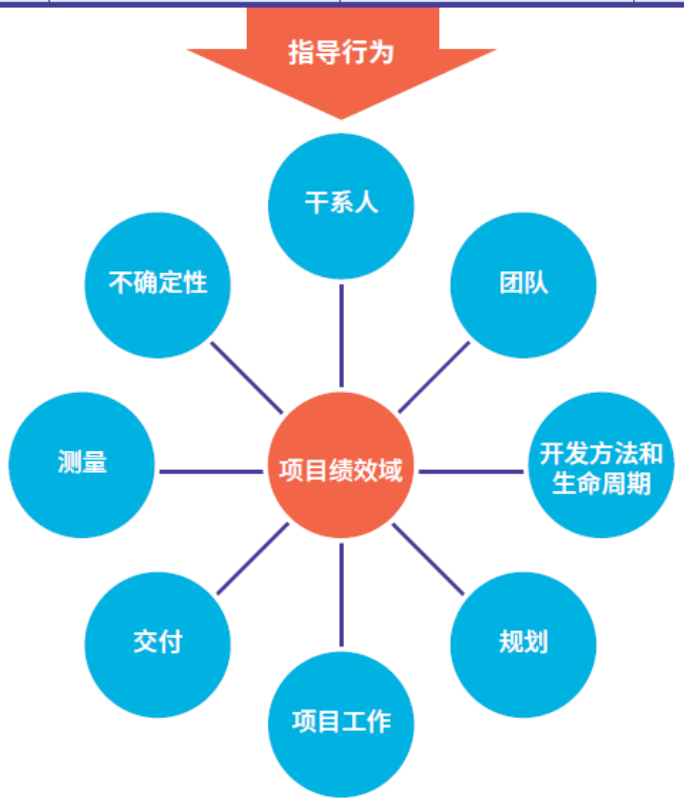

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖1.成为勤勉、尊重和关心他人的管家

管家式管理

在遵守内部和外部准则的同时，管家应以负责任的方式行事，以正直、关心和可信的态度开展活动。他们应对其所支持的项目的财务、社会和环境影响做出广泛承诺。

- 管家式管理包括在组织内部和外部的职责。
- 管家式管理包括：
  - 正直；
  - 关心；
  - 可信；
  - 合规。
- 秉持整体观的管家式管理会考虑财务、社会、技术和可持续的环境意识。

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖2.营造协作的项目团队环境

团队

项目团队由具有多样的技能、知识和经验的个人组成。与独自工作的个人相比，协同工作的项目团队可以更有效率且有效果地实现共同目标。

- 项目是由项目团队交付的。
- 项目团队在组织和职业文化和准则的范围内开展工作，通常会建立自己的“本地”文化。
- 协作的项目团队环境有助于：
  - 与其他组织文化和指南保持一致；
  - 个人和团队的学习和发展；
  - 为交付期望成果做出最佳贡献。

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖3.有效的干系人参与

干系人

积极主动地让干系人参与进来，使他们的参与达到促使项目成功和客户满意所需的程度。

- 干系人会影响项目、绩效和成果。
- 项目团队通过争取其他干系人参与为他们服务。
- 干系人参与积极推动价值交付。

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖4.聚焦于价值

价值

对项目是否符合商业目标以及预期收益和价值持续进行评估并作出调整。

- 价值是项目成功的最终指标。
- 价值可以在整个项目进行期间、项目结束时或项目完成后实现。
- 价值以及对价值具有促进作用的收益可以从定性和/或定量的角度来定义。
- 聚焦于成果可使项目团队能够支持创造价值的预期收益。
- 项目团队评估进展并进行适应性调整，从而使期望的价值最大化。

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖5.识别、评估和响应系统交互——系统思考

系统思考

从整体角度识别、评估和响应项目内部和周围的动态环境，从而积极地影响项目绩效。

- 项目是由多个相互依赖且相互作用的活动域组成的一个系统。
- 系统思考需要从整体角度了解项目的各个部分如何相互作用以及如何与外部系统交互。
- 系统不断变化，需要始终关注内部和外部条件。
- 项目团队应该对系统交互作出响应，从而允许项目团队充分利用积极的成果。

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖6.展现领导力行为

领导力

展现并调整领导力行为，为个人和团队的需要提供支持。

- 有效的领导力可促成项目取得成功，且有助于项目取得积极成果。
- 任何项目团队成员都可以表现出领导力行为。
- 领导力与职权不同。
- 有效的领导者会根据情境调整自己的风格。
- 有效的领导者会认识到项目团队成员之间的动机差异。
- 领导者应在以诚实、正直和道德行为规范方面展现出期望的行为。

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖7.根据环境进行裁剪

裁剪

根据项目的背景及其目标、干系人、治理和环境设计项目开发方法，使用“刚好够”的过程实现预期成果，同时使价值最大化、管理成本并提高速度。

- 每个项目都具有独特性。
- 项目成功取决于适应项目的独特环境，以确定产生预期成果的最适当方法。
- 对方法进行裁剪是迭代的，因此在整个项目进行期间，这种裁剪是一个持续的过程。

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖8.将质量融入到过程和可交付物中

质量

对产生可交付物的质量保持关注，这些可交付物要符合项目目标，并与相关干系人提出的需要、用途和验收需求保持一致。

- 项目质量要求达到干系人期望并满足项目和产品需求。
- 质量聚焦于达到可交付物的验收标准。
- 项目质量要求确保项目过程尽可能适当而有效。

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖9.驾驭复杂性

复杂性

不断评估和驾驭项目复杂性，以便这些方法和计划使项目团队能够成功驾驭项目生命周期。

- 复杂性是由人类行为、系统交互、不确定性和模糊性造成的。
- 复杂性可能会出现在项目期间的任何时候。
- 影响价值、范围、沟通、干系人、风险和技术创新的事件或情况可能会造成复杂性。
- 在识别复杂性的要素时，项目团队可以保持警惕，并通过各种方法来降低复杂性的数量或影响。

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖10.优化风险应对

风险

持续评估风险敞口(包括机会和威胁),以最大化地发挥正面影响,并最小化对项目及其成果的负面影响。

- 单个和整体风险可能会对项目产生影响。
- 风险可能是积极的(机会),也可能是消极的(威胁)。
- 项目团队会在整个项目进行期间不断应对各种风险。
- 组织的风险态度、偏好和临界值会影响风险的应对方式。
- 风险应对措施应该:
  - 与风险的重要性相匹配;
  - 具有成本效益;
  - 在项目环境中切合实际;
  - 相关干系人达成共识;
  - 由一名责任人承担。

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖11.拥抱适应性和韧性

适应性和韧性

将适应性和韧性融入组织和项目团队的方法之中，以帮助项目适应变革，从挫折中恢复过来并推进项目工作。

- 适应性是指应对不断变化的情形的能力。
- 韧性是指吸收冲击的能力和从挫折或失败中快速恢复的能力。
- 聚焦于成果而非输出，有助于增强适应性。

PMBOK第七版简介

12个项目管理原则

❖12.为实现预期的未来状态而驱动变革

变革

使受影响者做好准备，以采用和维持新的和不同的行为和过程，即从当前状态过渡到项目成果所带来的预期未来状态所需的行为和过程。

- 结构化的变革方法可帮助个人、群体和组织从当前状态过渡到未来的期望状态。
- 变革可能源于内部影响或外部来源。
- 促成变革可能具有挑战性，因为并非所有干系人都接受变革。
- 在短时间内尝试进行过多变革可能会导致变革疲劳和/或受到抵制。
- 干系人参与和激励的方法有助于使变革顺利进行。

PMBOK第七版简介

8个项目绩效域

❖1.干系人绩效域

干系人绩效域

干系人绩效域涉及与干系人相关的活动和功能。

有效执行此绩效域将产生以下预期成果：

- 在整个项目期间与干系人建立富有成效的工作关系。
- 干系人对项目目标表示同意。
- 作为项目受益人的干系人表示支持并感到满意，而对项目或其可交付物可能表示反对的干系人不会对项目成果产生负面影响。

PMBOK第七版简介

8个项目绩效域

❖2.团队绩效域

团队绩效域

团队绩效域涉及与负责生成项目可交付物以实现商业成果的相关的人员活动和功能。

有效执行此绩效域将产生以下预期成果：

- 共享责任。
- 高绩效团队。
- 所有团队成员都展现出相关领导力和其他人际关系技能。

PMBOK第七版简介

8个项目绩效域

❖3.开发方法和生命周期绩效域

开发方法和生命周期绩效域

开发方法和生命周期绩效域涉及与项目的开发方法、节奏和生命周期阶段相关的活动和功能。

有效执行此绩效域将产生以下预期成果：

- 与项目可交付物相符的开发方法。
- 由从项目开始到结束各个阶段组成的项目生命周期，这些阶段将业务交付与干系人价值联系起来。
- 由促进生成项目可交付物所需的交付节奏和开发方法的阶段组成的项目生命周期。

PMBOK第七版简介

8个项目绩效域

❖4.规划绩效域

规划绩效域

规划绩效域涉及为交付项目可交付物和项目成果所需的与初始、持续进行和演变的组织和协调相关的活动和功能。

有效执行此绩效域将产生以下预期成果：

- 项目以有条理、协调一致和经过周密考虑的方式推进。
- 有一种交付项目成果的整体方法。
- 对不断演变的信息做出了详细说明，以生成开展项目所寻求获得的可交付物和项目成果。
- 规划所花费的时间适合于相关情况。
- 规划信息足以管理干系人期望。
- 根据新出现的和不断变化的需要或条件，在整个项目期间有一个对计划进行调整的过程。

PMBOK第七版简介

8个项目绩效域

❖5.项目工作绩效域

项目工作绩效域

项目工作绩效域涉及与建立项目过程、管理实物资源和营造学习环境相关的活动和功能。

有效执行此绩效域将产生以下预期成果：

- 有效率且有效果的项目绩效。
- 适合项目和环境的项目过程。
- 干系人适当的沟通和参与。
- 有效管理实物资源。
- 对采购进行有效管理。
- 通过持续学习和过程改进提高团队能力。

PMBOK第七版简介

8个项目绩效域

❖6.交付绩效域

交付绩效域

交付绩效域涉及与交付项目要实现的范围和质量相关的活动和功能。

有效执行此绩效域将产生以下预期成果：

- 项目有助于实现业务目标和推进战略。
- 项目实现了启动它们要交付的成果。
- 在规划的时间框架内实现了项目收益。
- 项目团队对需求有清晰的理解。
- 干系人接受项目可交付物，并对其感到满意。

PMBOK第七版简介

8个项目绩效域

❖7.测量绩效域

测量绩效域

测量绩效域涉及与评估项目绩效和采取适当行动维持可接受绩效相关的活动和功能。

有效执行此绩效域将产生以下预期成果：

- 对项目状况产生可靠的理解。
- 促进决策的可操作数据。
- 及时采取适当行动，确保项目绩效处于正轨。
- 根据可靠的预测和评估做出明智而及时的决策来实现目标并产生商业价值。

PMBOK第七版简介

8个项目绩效域

❖8.不确定性绩效域

不确定性绩效域

不确定性绩效域涉及与风险和不确定性相关的活动和功能。

有效执行此绩效域将产生以下预期成果：

- 了解项目的运行环境，包括但不限于技术、社会、政治、市场和经济环境。
- 积极探索和应对不确定性。
- 了解项目中多个变量之间的相互依赖性。
- 能够预测威胁和机会并了解问题的后果。
- 项目交付很少受到或不会受到不可预见事件或情况的负面影响。
- 利用机会改进项目的绩效和成果。
- 有效利用成本和进度储备，从而与项目目标保持一致。

PMBOK第七版简介

❖裁剪

- 可以裁剪的项目方面包括：
  - ▶生命周期和开发方法的选择；
  - ▶过程；
  - ▶参与；
  - ▶工具；
  - ▶方法和工件。

PMBOK第七版简介

❖模型、方法和工件

- ▶模型。模型是解释过程、框架或现象的一种思考策略。
- ▶方法。方法是获得成果、输出、结果或项目可交付物的方式。
- ▶工件。工件可以是模板、文件、输出或项目可交付物。

❖常用模型

- 情境领导力模型
- 沟通模型
- 激励模型
- 变革模型
- 复杂性模型
- 项目团队发展模型
- 其他模型
  - 冲突模型;谈判;规划;过程组;凸显模型

PMBOK第七版简介

❖常用方法

- 数据收集和分析
- 估算
- 会议和活动
- 其他方法
  - 影响地图;建模;净推荐值 (NPS®);优先级模型;时间盒

PMBOK第七版简介

❖常用工件

- 战略工件
- 日志和登记册
- 计划
- 层级图
- 基准
- 可视化数据和信息
- 报告
- 协议和合同
- 其他工作
  - 活动清单；招标文件；度量指标；项目日历；需求文件；项目团队章程；用户故事
